


## 1. Bijlage Voortgang en planning versterkingsopgave per woonplaats, gemeente Groningen

### Voortgang en planning versterkingsopgave per woonplaats

Bijlage bij: Meerjaren-versterkingsplan en voortgang Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave – wensen en bedenkingen (juni 2021)

#### Winneweer

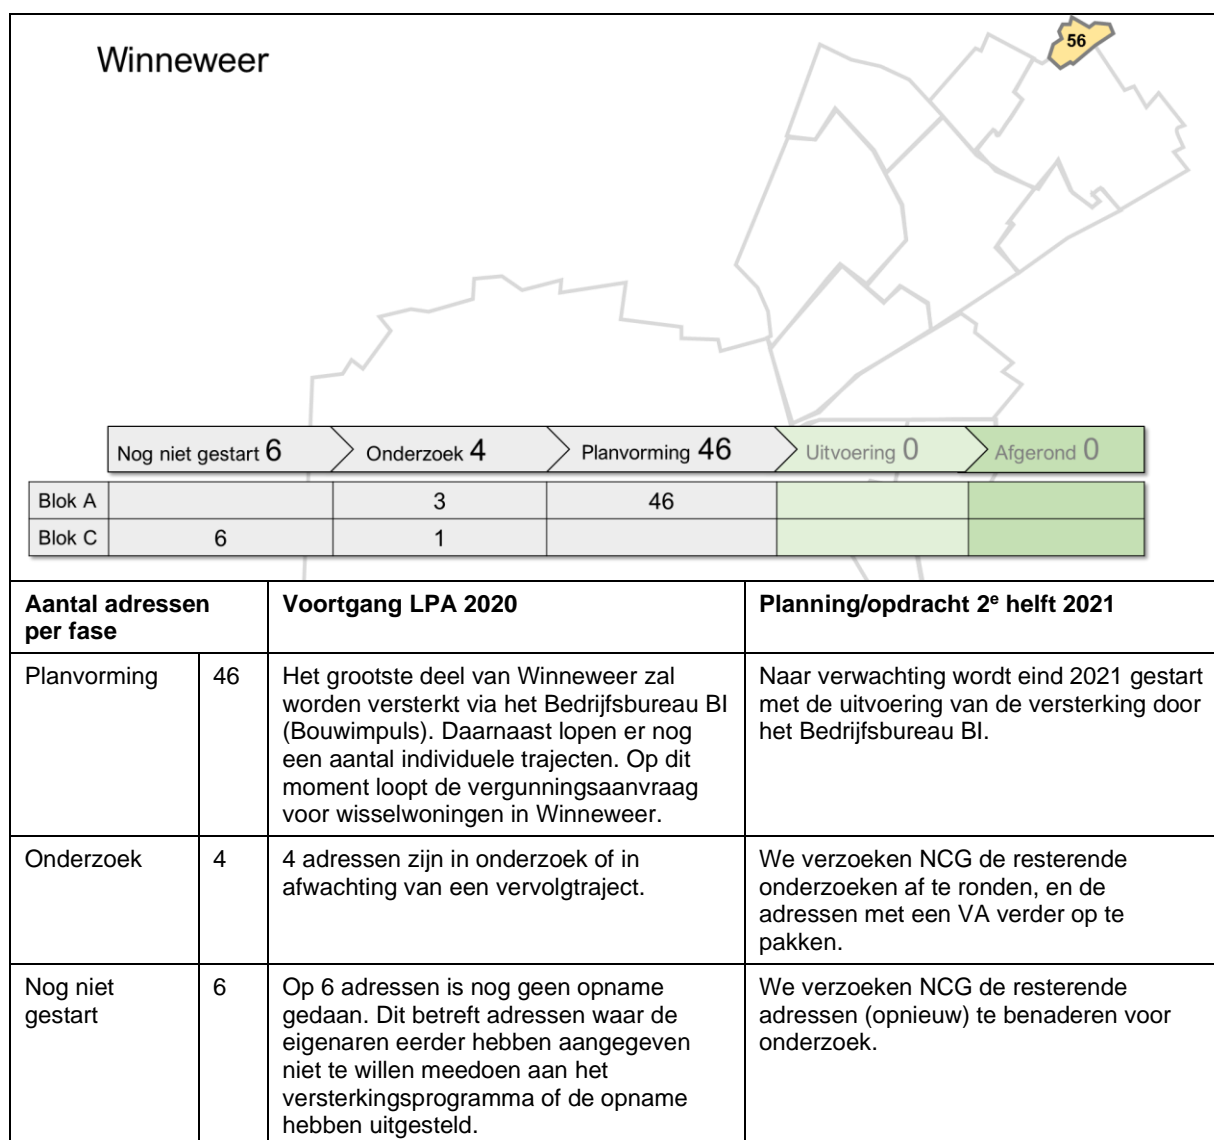


## 2. Bijlage Voortgang en planning versterkingsopgave per woonplaats, gemeente Groningen

### Lellens

Aantal adressen per fase		Voortgang LPA 2020		Planning/opdracht 2 <sup>e</sup> helft 2021	
Afgerond en administratief afgedaan	1	Het dorpshuis van Lellens is versterkt.			
Uitvoering	12	Een groot deel van het dorp Lellens wordt versterkt via het Bedrijfsbureau BI (Bouwimpuls). Er zijn wisselwoningen gerealiseerd, en de uitvoering van de versterking is gestart in het voorjaar van 2021.		In Lellens worden de woningen gefaseerd versterkt door het Bedrijfsbureau BI. Naar verwachting worden de laatste woningen in het eerste kwartaal van 2022 versterkt opgeleverd.	
Planvorming	14	Op een deel van de adressen worden de plannen voor de versterking door het Bedrijfsbureau BI momenteel nog uitgewerkt. In het buitengebied van Lellens zitten enkele adressen in het Agro-programma.			
Onderzoek	9	9 adressen zijn in onderzoek of in afwachting van een vervolgtraject, waarvan 4 adressen in het Agro-programma.		We verzoeken NCG de resterende onderzoeken af te ronden, en de adressen met een VA verder op te pakken (planning en uitvoering).	


  

Lellens		Voortgang LPA 2020				
		Nog niet gestart 0	Onderzoek 9	Planvorming 14	Uitvoering 12	Afgerond 1
Blok A			5	12	12	1 (dorpshuis)
Blok C			4	2		

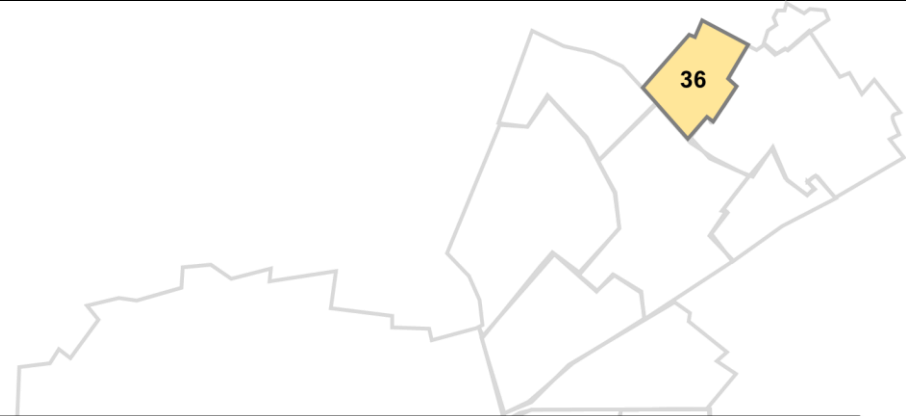

### 3. Bijlage Voortgang en planning versterkingsopgave per woonplaats, gemeente Groningen

#### Ten Post

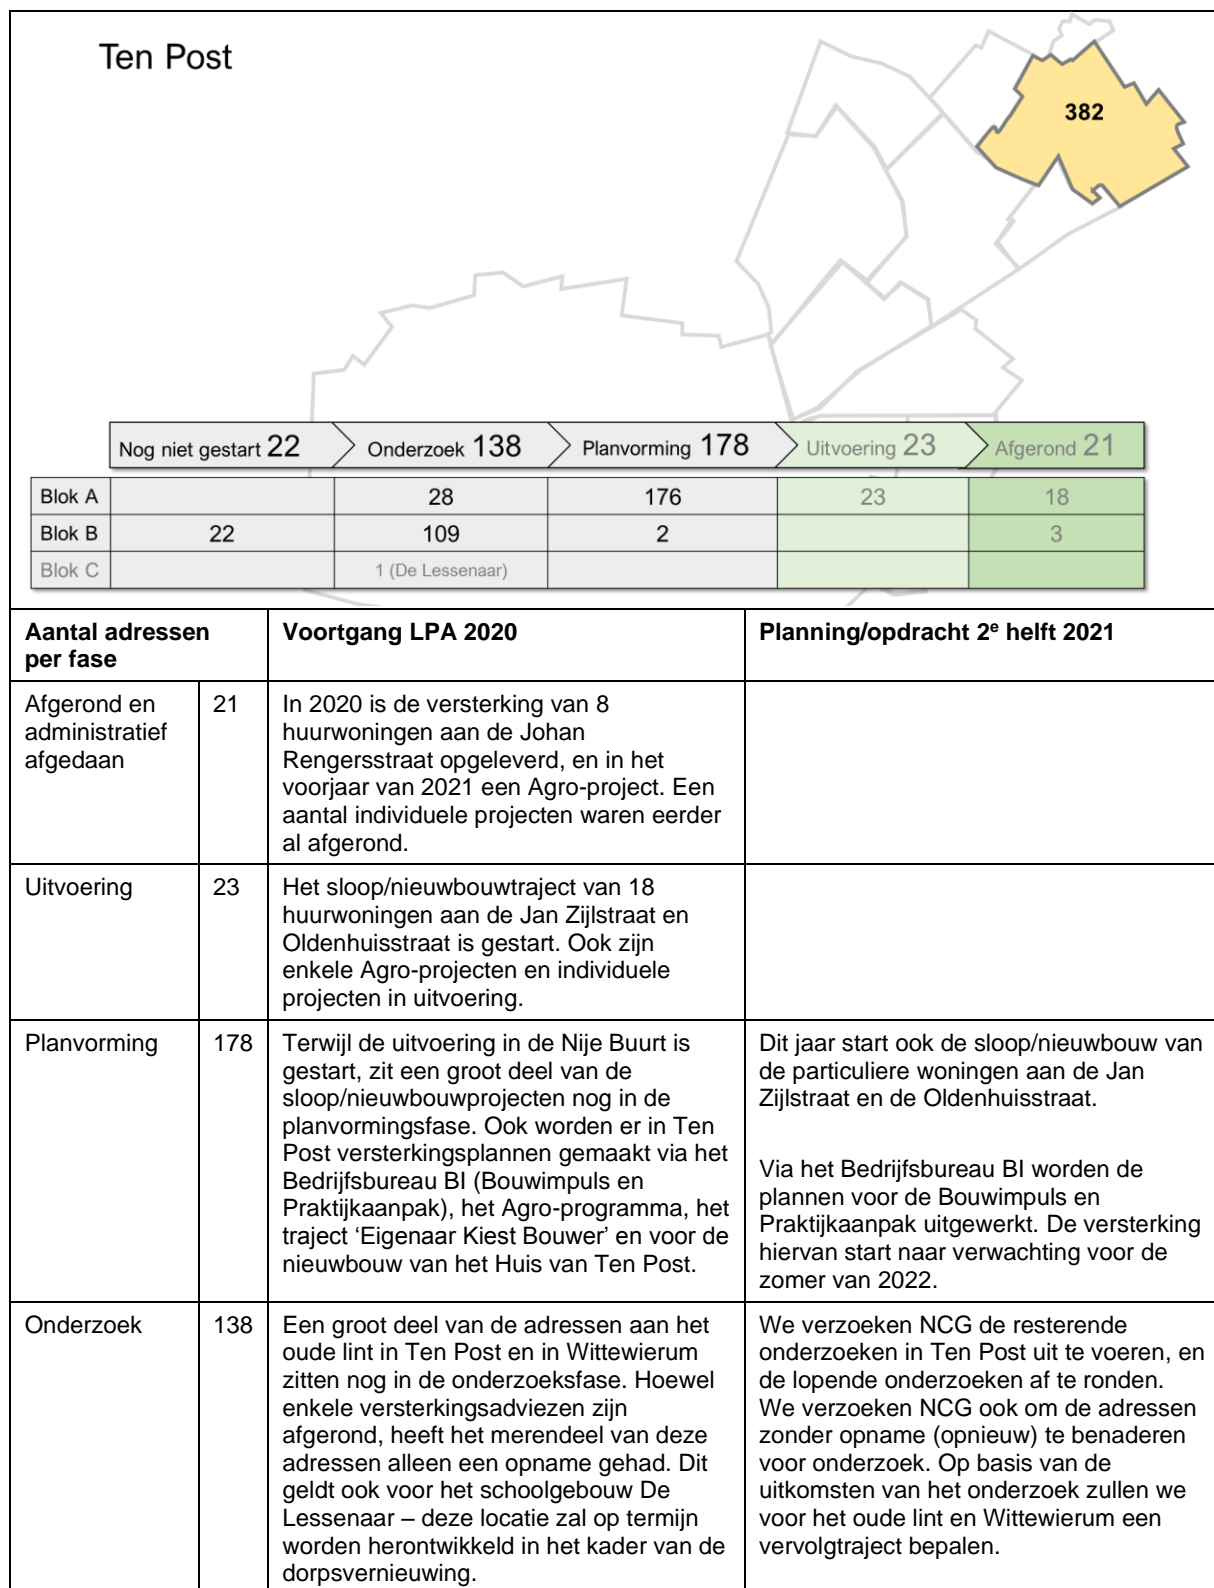

#### 4. Bijlage Voortgang en planning versterkingsopgave per woonplaats, gemeente Groningen


Nog niet gestart	22	Er resteren nog 22 adressen in Ten Post waar nog geen opname is gedaan. Dit betreft adressen waar de eigenaren eerder hebben aangegeven niet te willen meedoen aan het versterkingsprogramma of de opname hebben uitgesteld.
------------------	----	--

#### Woltersum

Aantal adressen per fase		Voortgang LPA 2020		Planning/opdracht 2 <sup>e</sup> helft 2021	
Afgerond en administratief afgedaan	5	Een aantal projecten in Woltersum zijn afgerond, waaronder het dorpshuis.			
Uitvoering	1	Op 1 adres wordt sloop-nieuwbouw uitgevoerd.			
Planvorming	72	Dit jaar zijn we in Woltersum begonnen met een traject waarbij de versterking, schadeherstel en funderingsproblematiek integraal kunnen worden aangepakt.		De uitvoering in Woltersum start na de zomer van dit jaar, en zal daarna gefaseerd worden vervolgd.	
Onderzoek	83	83 adressen zijn in onderzoek of in afwachting van een vervolgtraject.		We verzoeken NCG de resterende onderzoeken af te ronden. We verzoeken NCG ook om de adressen zonder opname (opnieuw) te benaderen voor onderzoek. Adressen waarvan het onderzoek is afgerond zullen in de komende jaren gefaseerd worden opgepakt voor het vervolgtraject.	
Nog niet gestart	8	Op 8 adressen is nog geen opname gedaan. Dit betreft adressen waar de eigenaren eerder hebben aangegeven niet te willen meedoen aan het versterkingsprogramma of de opname hebben uitgesteld.			


  

Woltersum		Voortgang per fase				
		Nog niet gestart	Onderzoek	Planvorming	Uitvoering	Afgerond
Blok A			60	67	1	4
Blok B	8		23	5		1

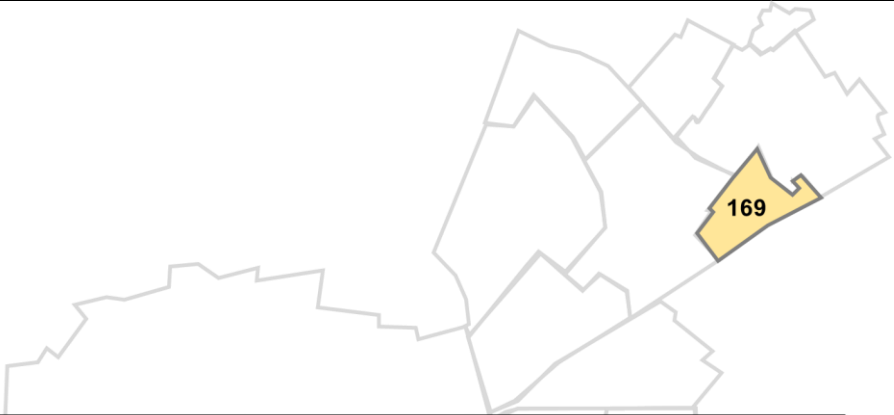


5. Bijlage Voortgang en planning versterkingsopgave per woonplaats, gemeente Groningen

**Ten Boer**

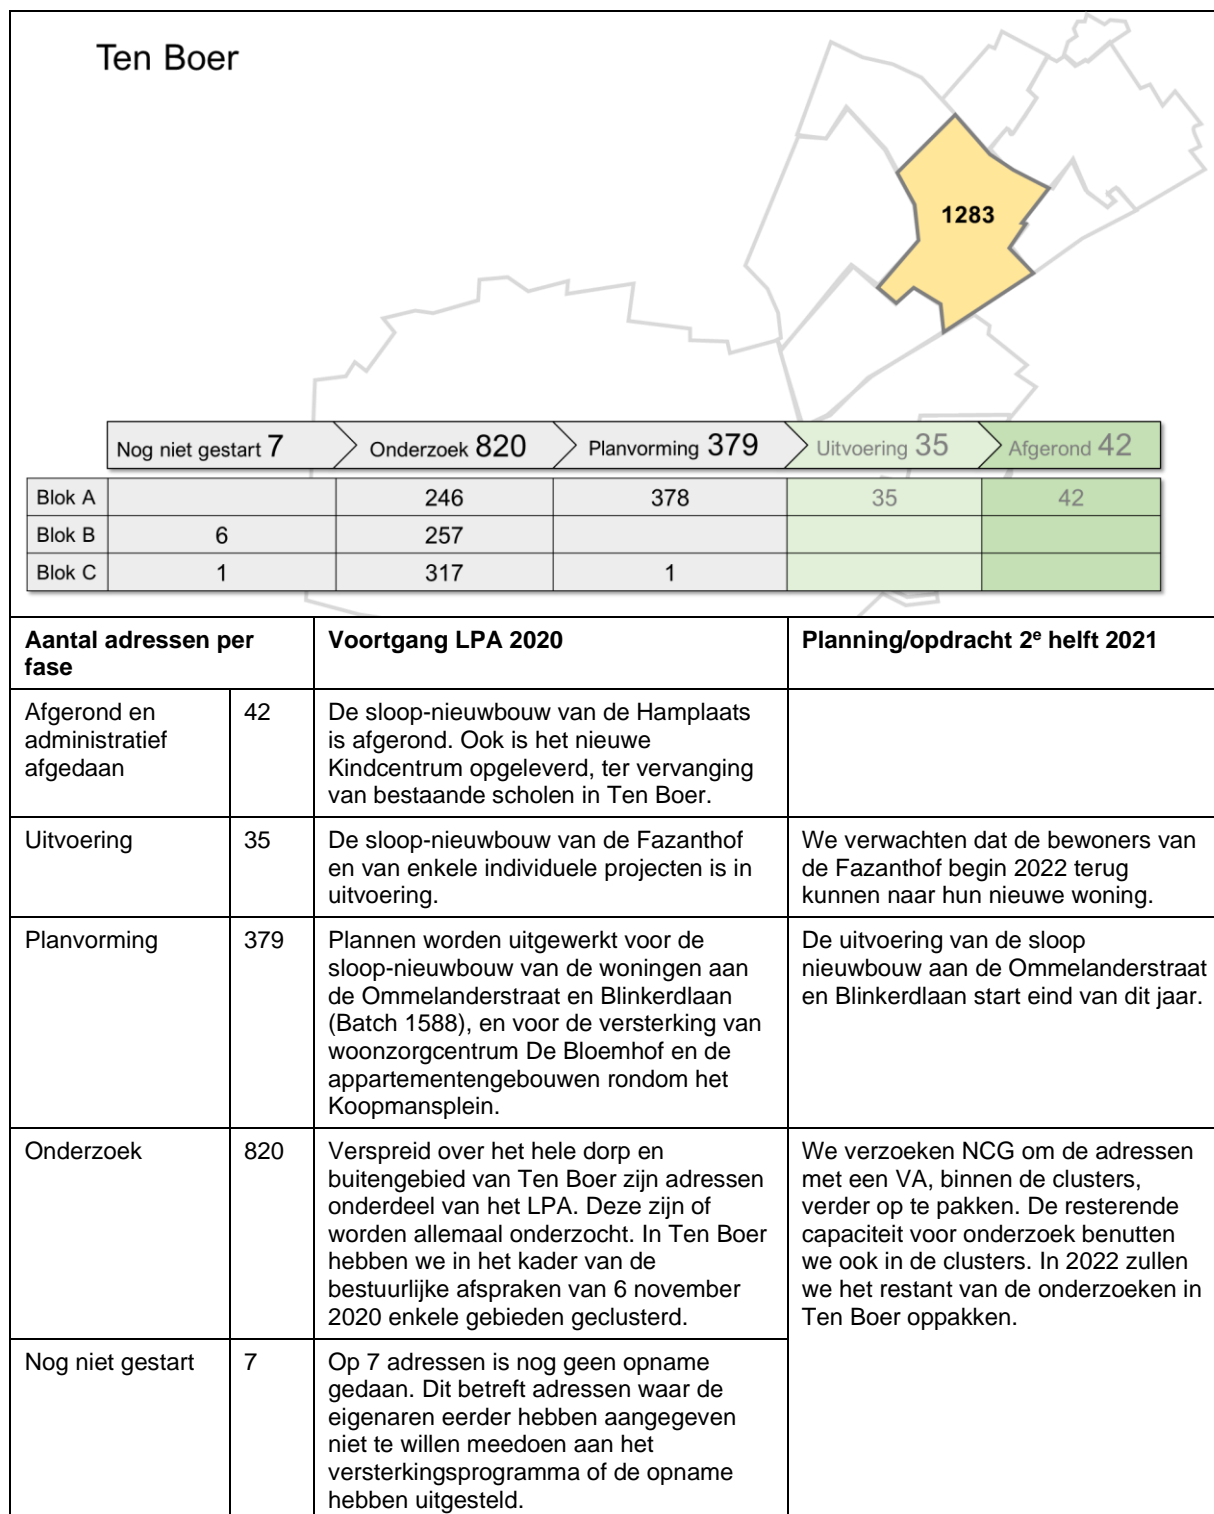

6. Bijlage Voortgang en planning versterkingsopgave per woonplaats, gemeente Groningen

**Sint Annen, Thesinge, Garmerwolde, Lageland, Harkstede en buitengebied Groningen**

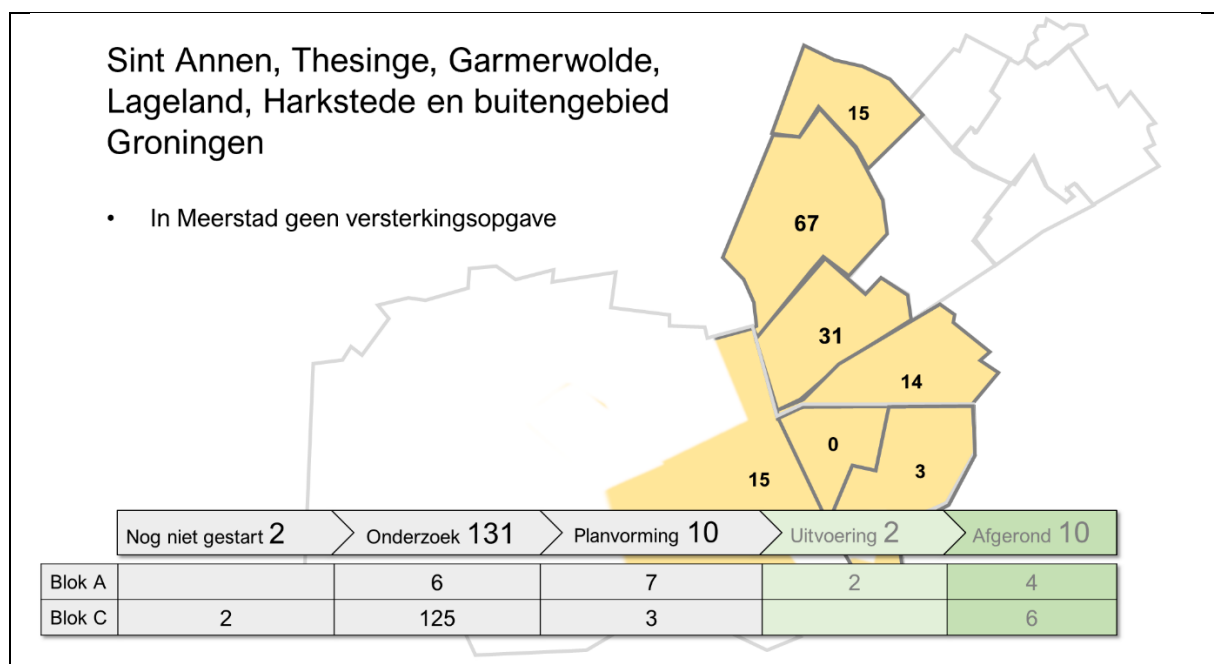

Aantal adressen per fase		Voortgang LPA 2020	Planning/opdracht 2 <sup>e</sup> helft 2021
Afgerond en administratief afgedaan	10	Het dorps huis in Garmerwolde is versterkt. Daarnaast zijn enkele adressen uit de scope inmiddels gesloopt en geen onderdeel meer van de versterkingsopgave.	
Uitvoering	2	De school in Thesinge wordt versterkt.	
Planvorming	10	Dit betreft enkele individuele projecten, Agro-projecten en de school in Garmerwolde.	
Onderzoek	131	In dit gebied zijn de adressen in het LPA toegevoegd op basis van het risicoprofiel in de HRA. Al deze adressen worden onderzocht, maar hebben in het LPA een lage prioriteit ten opzichte van de adressen aan de oostzijde van de gemeente.	De opnames worden uitgevoerd. Nieuwe beoordelingen volgen pas vanaf 2022, op basis van de beschikbare capaciteit.
Nog niet gestart	2	Deze adressen zijn per mutatie aan het LPA toegevoegd, na een administratieve correctie door NCG.	

7. Bijlage Voortgang en planning versterkingsopgave per woonplaats, gemeente Groningen

**Stad Groningen**

