

# MONSTERNEMINGSPLAN WATERBODEM

(door Erik in te vullen)

versie 1.0a – 06-04-2012

BASISGEGEVENS	
datum opdracht:	Onderzoekslocatie: WHA14-129 – Benedenloop Drentscha Aa-1
gewenste datum:	A.S.A.P.

CHECKLIST VKB protocol 2003 / NEN 5717		
<input type="checkbox"/> Waterbodem (2003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Aanleiding onderzoek</b>		
<input type="checkbox"/> Baggerwerkzaamheden	<input checked="" type="checkbox"/> Overige beheertaken, nl. Check op zware metalen	
Doel van het onderzoek:	Bepalen slibkwaliteit	
<b>Type onderzoek</b>		
<input type="checkbox"/> Kwaliteitsbepaling	<input type="checkbox"/> Lichte inspanning	<input type="checkbox"/> Normale inspanning
<input type="checkbox"/> Asbestonderzoek	<input type="checkbox"/> Anders, nl.	
<b>Oorsprong watergang en stromingsrichting</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Natuurlijke oorsprong	<input type="checkbox"/> Gegraven watergang	<input checked="" type="checkbox"/> Richting: Noord
<b>Laatste datum baggerwerkzaamheden</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Onbekend	<input type="checkbox"/> Bekend, nl.	
<b>Eerdere (water)bodemonderzoeken op en nabij onderzoekslocatie</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Onbekend / geen	<input type="checkbox"/> Aanwezig in dossier (en besproken bij overdracht)	
<b>Kwaliteit oppervlaktewater onderzoekslocatie</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Onbekend / geen	<input type="checkbox"/> Aanwezig in dossier (en besproken bij overdracht)	

Historische waterhuishoudkundige functies		
<input type="checkbox"/> Vaarweg	<input checked="" type="checkbox"/> Hoofdwatgang voor waterafvoer	
<input type="checkbox"/> Schouw sloot	<input type="checkbox"/> Anders, nl.	
<b>Historische activiteiten op aangrenzende percelen</b>		
<input type="checkbox"/> Wonen	<input type="checkbox"/> Recreatie	<input type="checkbox"/> Verkeer
<input type="checkbox"/> Bedrijf en/of Industrie, nl.	<input checked="" type="checkbox"/> Landbouw, nl.	<input type="checkbox"/> Anders, nl.

Onderzoekslocatie			
Lengte: 200 m.	Breedte: 9,0 – 10 m.	Waterdiepte: 1,30 – 1,70 m.	
Watertype:	<input type="checkbox"/> Lintvormig	<input checked="" type="checkbox"/> Niet Lintvormig	
Aantal steken per RE:		Aantal RE's :	
Kaarten aanwezig:	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja, incl. RE
VEILIGHEID			
Te verwachten verontreinigingen:			
Concentraties in waterbodem:	mg/kg ds	mg/kg ds	mg/kg ds
Asbest:	<input type="checkbox"/> Onverdacht	<input type="checkbox"/> Verdacht	
Veiligheidsklasse:	<input type="checkbox"/> Basisveiligheid	<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> F
Volledige en correcte informatie verstrekt door PL			
Veldwerker		Paraaf akkoord	- '13

# MONSTERNEMINGFORMULIER WATERBODEM KWALITEIT (door veldmedewerker in te vullen)

versie 1.0a – 04-02-2012

BASISGEGEVENS	
datum veldwerk:	Onderzoekslocatie:
naam veldmedewerker(s):	

CHECKLIST NEN 5717		
Afmeting onderzoekslocatie		
Lengte:	Breedte:	Waterdiepte:
Huidige waterhuishoudkundige functies		
<input type="checkbox"/> Vaarweg	<input type="checkbox"/> Hoofdwatergang voor waterafvoer	
<input type="checkbox"/> Schouw sloot	<input type="checkbox"/> Anders, nl	
Huidige activiteiten op aangrenzende percelen		
<input type="checkbox"/> Wonen	<input type="checkbox"/> Recreatie	<input type="checkbox"/> Verkeer
<input type="checkbox"/> Bedrijf en/of Industrie, nl.	<input type="checkbox"/> Landbouw, nl.	<input type="checkbox"/> Anders, nl.
Puntbronnen		
<input type="checkbox"/> Lozingpunten	<input type="checkbox"/> Overstorten	<input type="checkbox"/> Calamiteiten
<input type="checkbox"/> Onbekend	<input type="checkbox"/> Geen	<input type="checkbox"/> <i>Zie Kaart</i>
Diffuse bronnen		
<input type="checkbox"/> Verkeer	<input type="checkbox"/> Bestrijdingsmiddelen	<input type="checkbox"/> Anders, nl.
<input type="checkbox"/> Onbekend	<input type="checkbox"/> Geen	<input type="checkbox"/> <i>Zie Kaart</i>

Opmerkingen checklist NEN 5717

**TERREININSPECTIE** Tekening aanwezig Tekening niet aanwezig, zie schets bij formulier**X-Y coördinaten begin en eindpunt traject intekenen op situatieschets!** Voorinformatie is correct Voorinformatie is afwijkend, nl. Geen beschoeiing aanwezig Beschoeiing aanwezig, nl.**In geval van asbest direct bellen met de projectleider Erik****FOTO'S VAN AFWIJKINGEN NEMEN****GEBRUIKTE APPARATUUR EN MATERIAAL** Zuigerboor Veenboor Veenhapper Beekersampler Boot Quad**Maximale afwijking meting:** X: Y:**Monstermateriaal:** emmers waterlab potten waterlab**Overige Opmerkingen checklist**






**Trajectlengte: 200 m.  
Verdacht**



WATERSCHAP  
**Hunze en Aa's**

**Legenda**

- ↑ overstorten
- ⊘ inlaten
- gemalen
- ∩ Stuwen
- te baggeren traject

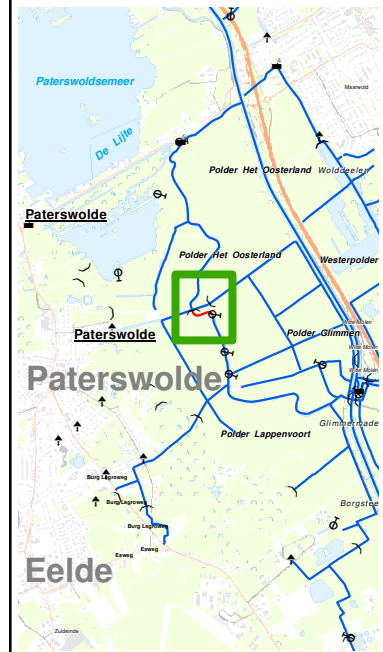

**WHA14-129  
Benedenloop  
Drentsche Aa-1**

Tekenaar: H. Wilting

Datum: 18-09-2014

1:5000

