

# Lokaal Plan van Aanpak 2024

## Versterken en Vernieuwen

15 november 2023

Henk Bakker, André Westerveld, Kevin Gooijert



# Agenda

- 1. Inleiding
- 2. Versterking, prioritering, ondersteuning
- 3. Parlementaire Enquête Gaswinning, 'Nij Begun'
- 4. Resultaten 2023
- 5. LPA 2024
- 6. Vragen?



# Versterken

- Gemeenteraad bepaalt kaders en stelt LPA vast
  - College voert uit
- NCG (uitvoeringsorganisatie EZK) verantwoordelijk voor de versterking
- Uitzondering: batch 1588
  - Hamplaats
  - Ommelanderstraat/Blinkerdlaan
- VOG/BOG: regionaal bestuurlijk overleg
  - 5 gemeenten, provincie, NCG, EZK
- Lokale Stuurgroep:
  - Bijsturing o.b.v. LPA gedurende het jaar
  - Gemeente, NCG, woningcorporatie W&B, Woonzorg Nederland



# Parlementaire Enquête Gaswinning en 'Nij Begun'

- Inhoud rapport parlementaire enquêtecommissie
- Kabinetsreactie: 50 maatregelen
  - Thema's van de maatregelen
  - Met welke maatregelen zijn we al aan de slag?
  - Invloed maatregelen op versterkingsoperatie
  - Invloed maatregelen op governance
    - Sociale agenda, agenda perspectief, agenda Herstel van Groningen
- Rapport Commissie Verschillen
  - Onuitlegbare verschillen



# Communicatie en ondersteuning


- Inlooppunten: Ten Boer, Ten Post, Woltersum
  - Gemeente, NCG, IMG
- Aardbevingscoaches (WIJ-team Ten Boer)
- Bewonersbegeleiders NCG
- Informatiebijeenkomsten
- Nieuwsbrieven (fysiek en digitaal)
- Website en email




# Afbakening

Adressen in Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave

- Percentage van totaal aantal adressen  
0-5% 5-20% 60-70% 100%

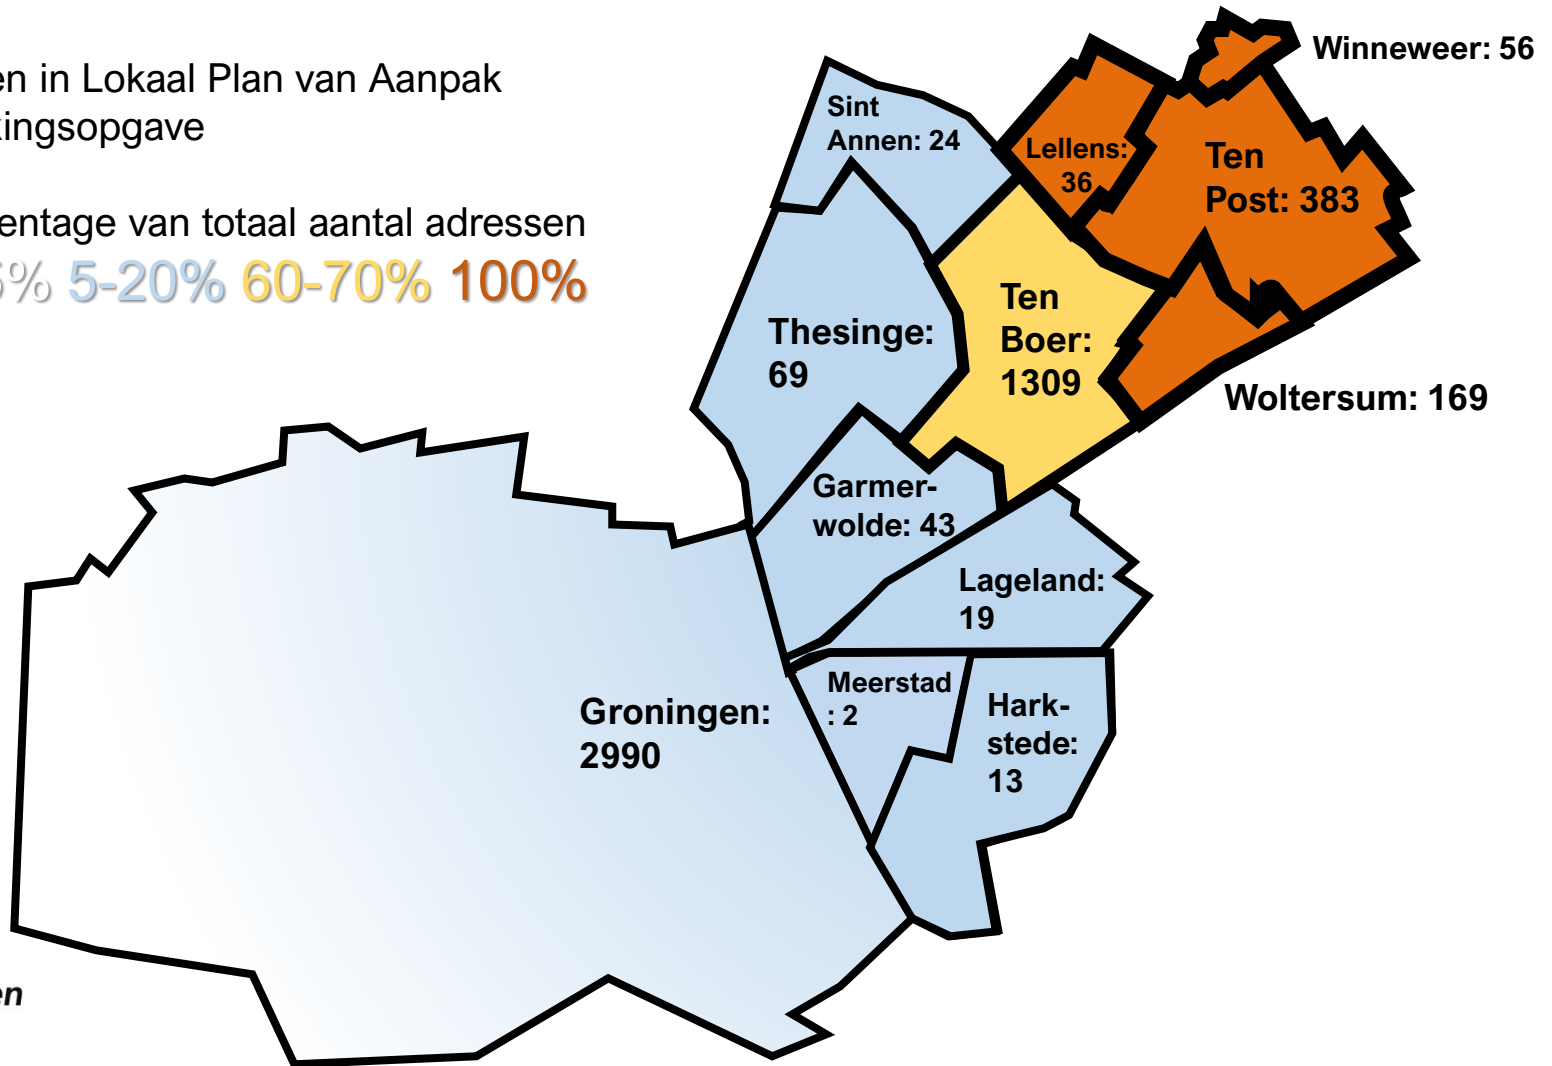

# Realisatie 2023

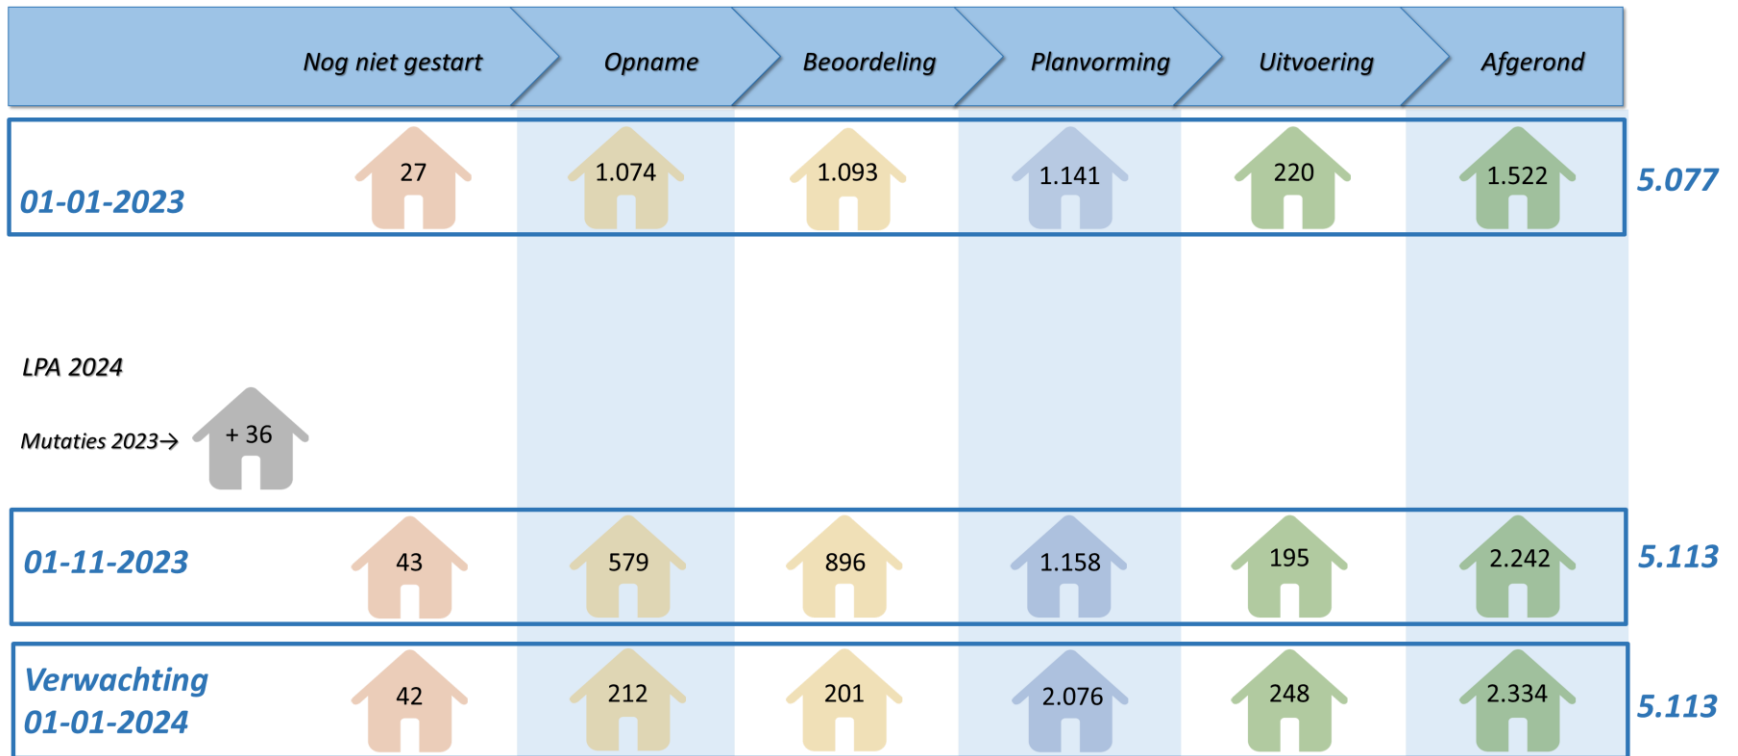

# Resultaten Lokaal Plan van Aanpak (LPA) 2023

- Belangrijke aanpassingen in 2023:
  - ‘Uitruil’ adressen
  - Verduurzaming Ten Post (subsidieregeling)
  - Meer sloop/nieuwbouw  
(Ommelanderstraat/Blinkerdlaan)



# Resultaten Lokaal Plan van Aanpak (LPA) 2023

- Overzicht voortgang + prognose 31/12

|                          | Planning 2023 | Realisatie 15/11/23 | Prognose 31/12/23 |
|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Beoordelingen            | 1.702         | 804                 | 1.410             |
| Uitvoering<br>(LPA 2023) | 385           | 211                 | 350               |
| Bouw gereed              | 131           | 128                 | 195               |
| Afgerond                 | 205           | 664                 | 758               |

# LPA 2024 Beoordelingen

- Nog ca. 1500 adressen in beoordelingsfase:
  - Deadline levering versterkingsadviezen najaar 2023 voor ingenieursbureaus
  - Waarschijnlijkheid levering deel versterkingsadviezen in Q1 2024
  - Enkele tientallen laten langer op zich wachten door:
    - Moeilijk of geen contact met eigenaars
    - Uitstellers
    - Herbeoordelaars (blok A)
    - Nieuwe adressen toegevoegd aan scope, bijv. via LOOV

# LPA 2024 Uitvoering

| <i>Adressen gemeente Groningen voor O&amp;R</i> | <i>Aantal adressen 2024</i> |
|---|-----------------------------|
| <i>Garmerwolde</i>                              | 8                           |
| <i>Meerstad</i>                                 | 1                           |
| <i>Harkstede</i>                                | -                           |
| <i>Lageland</i>                                 | 7                           |
| <i>Lellens</i>                                  | 3                           |
| <i>Sint Annen</i>                               | 7                           |
| <i>Ten Boer</i>                                 | 179                         |
| <i>Ten Post</i>                                 | 48                          |
| <i>Thesinge</i>                                 | 17                          |
| <i>Winneweer</i>                                | 5                           |
| <i>Woltersum</i>                                | 16                          |
| <i>Totaal</i>                                   | 291 (251,6 gewogen)         |

- Betreft adressen die na beoordeling in fase uitvoering komen (plan maken)
- Ook start met Stad Groningen
- Sturing ook op mijlpalen uitvoering:
  - Start bouw, bouw gereed, afgerond
  - In kernteams van de dorpen

